# COMUNE DI NICHELINO
# PROVINCIA DI TORINO

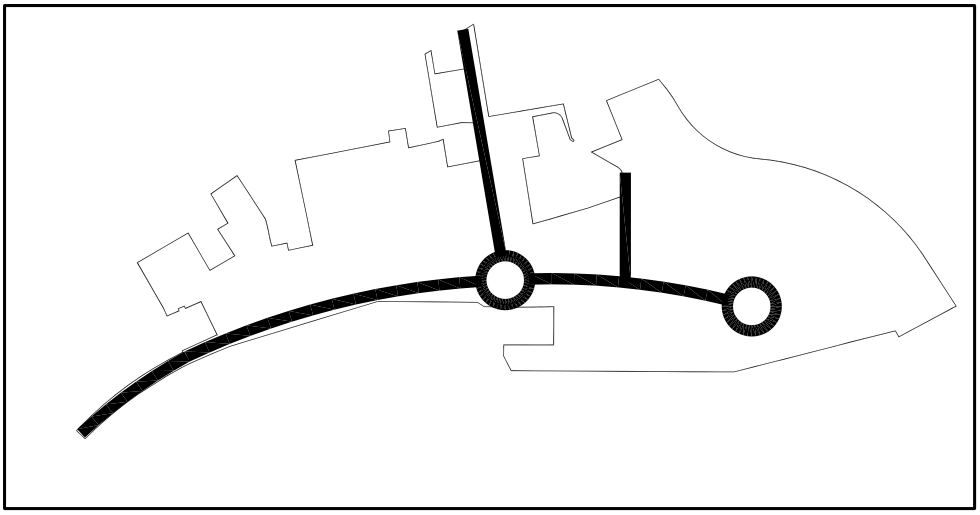

# PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
# P.I.P.4

Legge 22/10/1971 n. 865 art. 27

Legge Regionale 05/12/1977 n. 56 art. 42 e s.m.i.

## PROGETTO ESECUTIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE

Il Sindaco: Dott. G. Catizone

L'Assessore all'Urbanistica: Rag. F. Fattori

Il Segretario Comunale: Dott. R. Camarda

so.p.r.in. S.p.A.

progetto con

Ing. Silvano VEDELAGO
Arch. Sara DOMINICI
Arch. Claudia CEVRERO

MEDIA STUDIO POLIS

STUDIO MEDIAPOLIS s.r.l.
Via della Rocca n. 21-10123 TORINO
Tel. 011/812.78.37 - Fax 011/812.79.19
Internet: http://www.gruppomediapolis.com
E-Mail: studio@gruppomediapolis.com

| documento | tavola | scala |
|---|---|---|
| CRONOPROGRAMMA | AII.C | commessa 03/0283 |
| | sostituisce | note |

| Revisione | data | oggetto di revisione | consegnata | redatto | verificato | approvato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25/01/2006 | Emissione | Si | S.D. | F.F. | S.V. |

File 0283-Nichelino/0283-PIP/0283-ESE-OOUU/0283-PIP-ESE-OOUU-SI-Cronoprogramma

plot

Il presente disegno è di proprietà esclusiva e non può essere divulgato o riprodotto anche solo parzialmente senza autorizzazione ai sensi della Legge n° 633 del 24/04/1941

PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI P.I.P. 4
PROGETTO ESECUTIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE
Rev. 0 del 25/01/06

| ID | Nome attività | Durata | Inizio | Fine | Predecessori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ALLESTIMENTO CANTIERE** | **5 g** | **mar 18/04/06** | **lun 24/04/06** | |
| 2 | **DEMOLIZIONI** | **7 g** | **mer 26/04/06** | **ven 05/05/06** | |
| 3 | Bassi fabbricati-Rimozione amianto | 5 g | mer 26/04/06 | mer 03/05/06 | 1 |
| 4 | Banchina | 2 g | gio 04/05/06 | ven 05/05/06 | 3 |
| 5 | **OPERE STRADALI** | **230 g** | **lun 08/05/06** | **gio 12/04/07** | |
| 6 | **SCAVI** | **75 g** | **lun 08/05/06** | **mar 29/08/06** | |
| 7 | Strade e marciapiedi | 40 g | lun 08/05/06 | lun 03/07/06 | 4 |
| 8 | Giardino | 15 g | mar 01/08/06 | mar 29/08/06 | 10IF |
| 9 | **STRADE** | **100 g** | **mar 29/08/06** | **gio 25/01/07** | |
| 10 | Misto granulare anidro | 45 g | mar 29/08/06 | lun 30/10/06 | 36II+15 g |
| 11 | Misto frantumato | 45 g | mar 19/09/06 | mar 21/11/06 | 16II+15 g |
| 12 | Tout-venant | 45 g | mar 10/10/06 | mer 13/12/06 | 11II+15 g |
| 13 | Binder | 45 g | mar 31/10/06 | gio 11/01/07 | 12II+15 g |
| 14 | Emulsione bituminosa | 25 g | gio 14/12/06 | gio 25/01/07 | 17II+15 g |
| 15 | **MARCIAPIEDI** | **125 g** | **mar 29/08/06** | **gio 01/03/07** | |
| 16 | Misto granulare anidro | 45 g | mar 29/08/06 | lun 30/10/06 | 36II+15 g |
| 17 | Fondazione in cls | 45 g | mer 22/11/06 | gio 01/02/07 | 20II+15 g |
| 18 | Strato di usura | 45 g | gio 21/12/06 | gio 01/03/07 | 17II+20 g |
| 19 | Posa marmette autobloccanti | 30 g | gio 21/12/06 | gio 08/02/07 | 17II+20 g |
| 20 | Posa cordoli in pietra | 40 g | mar 31/10/06 | gio 04/01/07 | 10 |
| 21 | **SISTEMAZIONI ESTERNE** | **110 g** | **mar 31/10/06** | **gio 12/04/07** | |
| 22 | Posa cordoli in cls | 40 g | mar 31/10/06 | gio 04/01/07 | 10 |
| 23 | Formazione di aiuole | 40 g | ven 19/01/07 | gio 15/03/07 | 18II+15 g |
| 24 | Semina e piantamento | 20 g | ven 16/03/07 | gio 12/04/07 | 23 |
| 25 | Pavimentazione stabilizzata area bimbi | 15 g | mer 22/11/06 | mer 13/12/06 | 22II+15 g |
| 26 | Posa panchine | 5 g | ven 09/02/07 | gio 15/02/07 | 19 |
| 27 | Allestimento area gioco bimbi | 10 g | ven 09/02/07 | gio 22/02/07 | 19;25 |
| 28 | **RETE FOGNARIA** | **115 g** | **lun 22/05/06** | **mar 07/11/06** | |
| 29 | **FOGNATURA NERA** | **115 g** | **lun 22/05/06** | **mar 07/11/06** | |
| 30 | Scavo in trincea | 60 g | lun 22/05/06 | lun 21/08/06 | 7II+10 g |
| 31 | Platea in cls | 60 g | mar 06/06/06 | lun 04/09/06 | 30FF+10 g |
| 32 | Posa pozzetti | 50 g | mar 04/07/06 | lun 18/09/06 | 31FF+10 g |
| 33 | Posa tubi in pvc | 60 g | mar 04/07/06 | lun 02/10/06 | 32II |
| 34 | Calottatura in cls | 60 g | mar 18/07/06 | lun 16/10/06 | 33FF+10 g |
| 35 | Posa chiusini | 15 g | mar 17/10/06 | mar 07/11/06 | 34 |
| 36 | Riempimento scavi | 60 g | mar 01/08/06 | lun 30/10/06 | 34II+10 g |
| 37 | **FOGNATURA BIANCA** | **115 g** | **lun 22/05/06** | **mar 07/11/06** | |
| 38 | Scavo in trincea | 60 g | lun 22/05/06 | lun 21/08/06 | 30FF |
| 39 | Platea in cls | 60 g | mar 06/06/06 | lun 04/09/06 | 38FF+10 g |
| 40 | Posa pozzetti | 50 g | mar 04/07/06 | lun 18/09/06 | 31FF+10 g |
| 41 | Posa tubi in cls | 60 g | mar 04/07/06 | lun 02/10/06 | 32II |
| 42 | Posa caditoie | 60 g | mar 04/07/06 | lun 02/10/06 | 32II |
| 43 | Posa chiusini | 15 g | mar 17/10/06 | mar 07/11/06 | 34 |
| 44 | Riempimento scavi | 60 g | mar 01/08/06 | lun 30/10/06 | 34II+10 g |
| 45 | **RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA** | **150 g** | **lun 22/05/06** | **gio 04/01/07** | |
| 46 | Scavo in trincea | 60 g | lun 22/05/06 | lun 21/08/06 | 7II+10 g |
| 47 | Platea in cls | 60 g | mar 13/06/06 | lun 11/09/06 | 46FF+15 g |
| 48 | Esecuzione pozzetti | 50 g | mar 18/07/06 | lun 02/10/06 | 47FF+15 g |
| 49 | Posa cavidotti | 60 g | mar 18/07/06 | lun 16/10/06 | 48II |
| 50 | Posa cavi | 40 g | mar 29/08/06 | lun 23/10/06 | 49II+25 g |
| 51 | Posa chiusini | 15 g | mer 06/12/06 | gio 04/01/07 | 52 |
| 52 | Riempimento scavi | 60 g | mar 12/09/06 | mar 05/12/06 | 50II+10 g;67II+10 |
| 53 | **RETE IDRICA** | **150 g** | **lun 22/05/06** | **gio 04/01/07** | |
| 54 | Scavo in trincea | 60 g | lun 22/05/06 | lun 21/08/06 | 7II+10 g |
| 55 | Platea in cls | 60 g | mar 13/06/06 | lun 11/09/06 | 54FF+15 g |
| 56 | Esecuzione pozzetti | 50 g | mar 18/07/06 | lun 02/10/06 | 55FF+15 g |
| 57 | Posa tubazioni | 60 g | mar 18/07/06 | lun 16/10/06 | 56II |
| 58 | Posa chiusini | 15 g | mer 06/12/06 | gio 04/01/07 | 60 |
| 59 | Idranti antincendio | 15 g | mar 17/10/06 | mar 07/11/06 | 57 |
| 60 | Riempimento scavi | 60 g | mar 12/09/06 | mar 05/12/06 | 50II+10 g;67II+10 |
| 61 | **RETE ENERGIA ELETTRICA** | **170 g** | **lun 22/05/06** | **gio 01/02/07** | |
| 62 | Realizzazione cabine di trasformazione | 35 g | mer 06/12/06 | gio 01/02/07 | 52 |
| 63 | Scavo in trincea | 60 g | lun 22/05/06 | lun 21/08/06 | 7II+10 g |
| 64 | Platea in cls | 60 g | mar 13/06/06 | lun 11/09/06 | 63FF+15 g |
| 65 | Esecuzione pozzetti | 50 g | mar 18/07/06 | lun 02/10/06 | 64FF+15 g |
| 66 | Posa cavidotti | 60 g | mar 18/07/06 | lun 16/10/06 | 65II |
| 67 | Posa cavi | 40 g | mar 29/08/06 | lun 23/10/06 | 66II+25 g |
| 68 | Posa chiusini | 15 g | mer 06/12/06 | gio 04/01/07 | 69 |
| 69 | Riempimento scavi | 60 g | mar 12/09/06 | mar 05/12/06 | 50II+10 g;67II+10 |
| 70 | **RETE GAS** | **150 g** | **lun 22/05/06** | **gio 04/01/07** | |
| 71 | Scavo in trincea | 60 g | lun 22/05/06 | lun 21/08/06 | 7II+10 g |
| 72 | Platea in cls | 60 g | mar 13/06/06 | lun 11/09/06 | 71FF+15 g |
| 73 | Esecuzione pozzetti | 50 g | mar 18/07/06 | lun 02/10/06 | 72FF+15 g |
| 74 | Posa tubazioni | 60 g | mar 18/07/06 | lun 16/10/06 | 73II |
| 75 | Posa chiusini | 15 g | mer 06/12/06 | gio 04/01/07 | 76 |
| 76 | Riempimento scavi | 60 g | mar 12/09/06 | mar 05/12/06 | 50II+10 g;67II+10 |
| 77 | **RETE TELECOM** | **150 g** | **lun 22/05/06** | **gio 04/01/07** | |
| 78 | Scavo in trincea | 60 g | lun 22/05/06 | lun 21/08/06 | 7II+10 g |
| 79 | Platea in cls | 60 g | mar 13/06/06 | lun 11/09/06 | 78FF+15 g |
| 80 | Esecuzione pozzetti | 50 g | mar 18/07/06 | lun 02/10/06 | 79FF+15 g |
| 81 | Posa cavidotti | 60 g | mar 18/07/06 | lun 16/10/06 | 80II |
| 82 | Posa cavi | 40 g | mar 29/08/06 | lun 23/10/06 | 81II+25 g |
| 83 | Posa chiusini | 15 g | mer 06/12/06 | gio 04/01/07 | 84 |
| 84 | Riempimento scavi | 60 g | mar 12/09/06 | mar 05/12/06 | 50II+10 g;67II+10 |
| 85 | **CHIUSURA CANTIERE** | **10 g** | **ven 13/04/07** | **ven 27/04/07** | **24** |

Progetto: 0283-PIP-ESE-OOUU-Cron
Data: lun 20/02/06

Attività | Cardine | Attività riportata | Avanzamento riportato | Attività esterne | Riepilogo raggruppamento
Avanzamento | Riepilogo | Cardine riportato | Divisione | Riepilogo progetto
